

---

# *Praca projektowa:*



ZADANIE:

Opracowanie **Karty Projektu** z uwzględnieniem preferowanej metodyki zarządzania projektem

dr Marian Krupa

# ***Karta projektu***

*- wprowadzenie*

## ***Karta projektu / Dokument inicjujący projekt***

- Karta projektu (ang. *Project Charter*) – dokument definiujący cele projektu zakres, metodykę pracy, dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (kierownika projektu, sponsora oraz klienta). [PMBOK Guide].
- W PRINCE2 podobny dokument występuje pod nazwą *Project Brief* („Podstawowe Założenia Projektowe”).
- Celem stworzenia karty projektu jest **dokumentacja** wstępnych wymagań, które należy spełnić aby projekt został uruchomiony, spisanie oczekiwań interesariuszy, strategii oraz metod pracy. Określa także ryzyka i zagrożenia. [mfiles.pl].

# ZADANIE:

**Uczelnia Łazarskiego** podpisała umowę na wdrożenie **zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP**.

Zlecono Twojemu zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie formalnej strony projektu, przygotowanie *Karty Projektu*.

*Dokument powinien m.in. zawierać:*

- 1) Definicja Projektu**
- 2) Uzasadnienie Biznesowe Projektu**
- 3) Strukturę Zespołu Projektowego**
- 4) ...**

# ZADANIE:


## **Zintegrowany system zarządzania klasy ERP?**

Oprogramowanie obejmujące Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (organizacji) (*ang. Enterprise Resource Planning*), którego głównym celem jest zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

System zintegrowany pozwalający zarządzanie wszystkimi, kluczowymi procesami biznesowymi przy pomocy jednej bazy danych.


# ZADANIE:

## Zintegrowany system zarządzania klasy ERP?

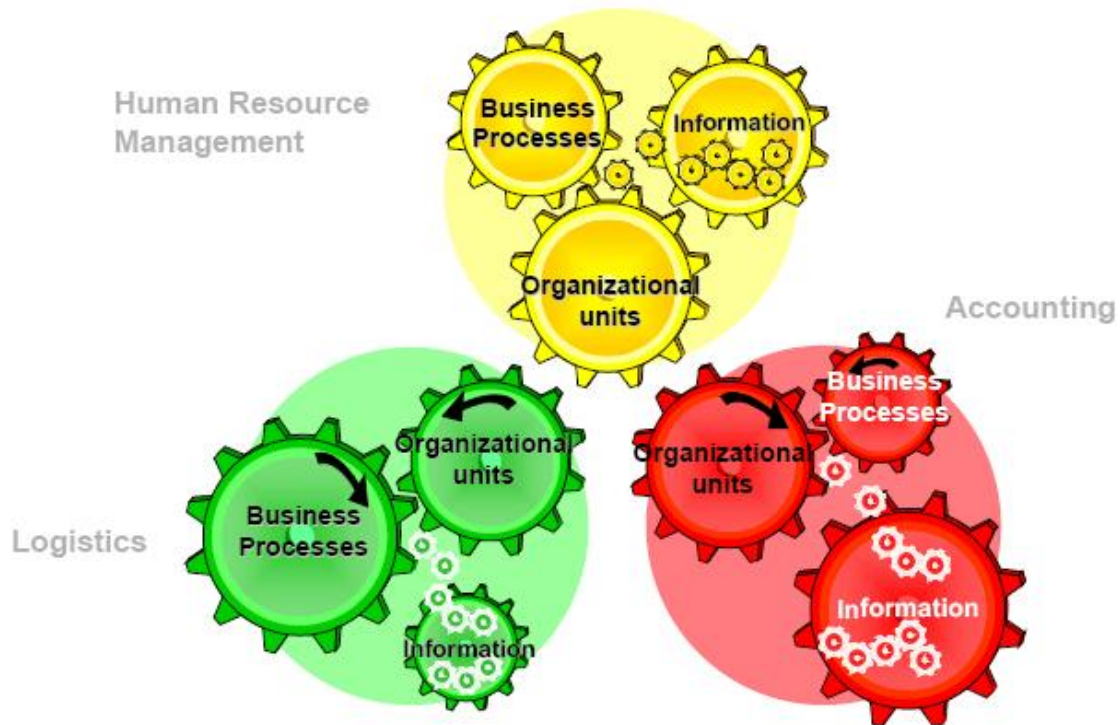

# ZADANIE:

**Zintegrowany system zarządzania klasy ERP?**

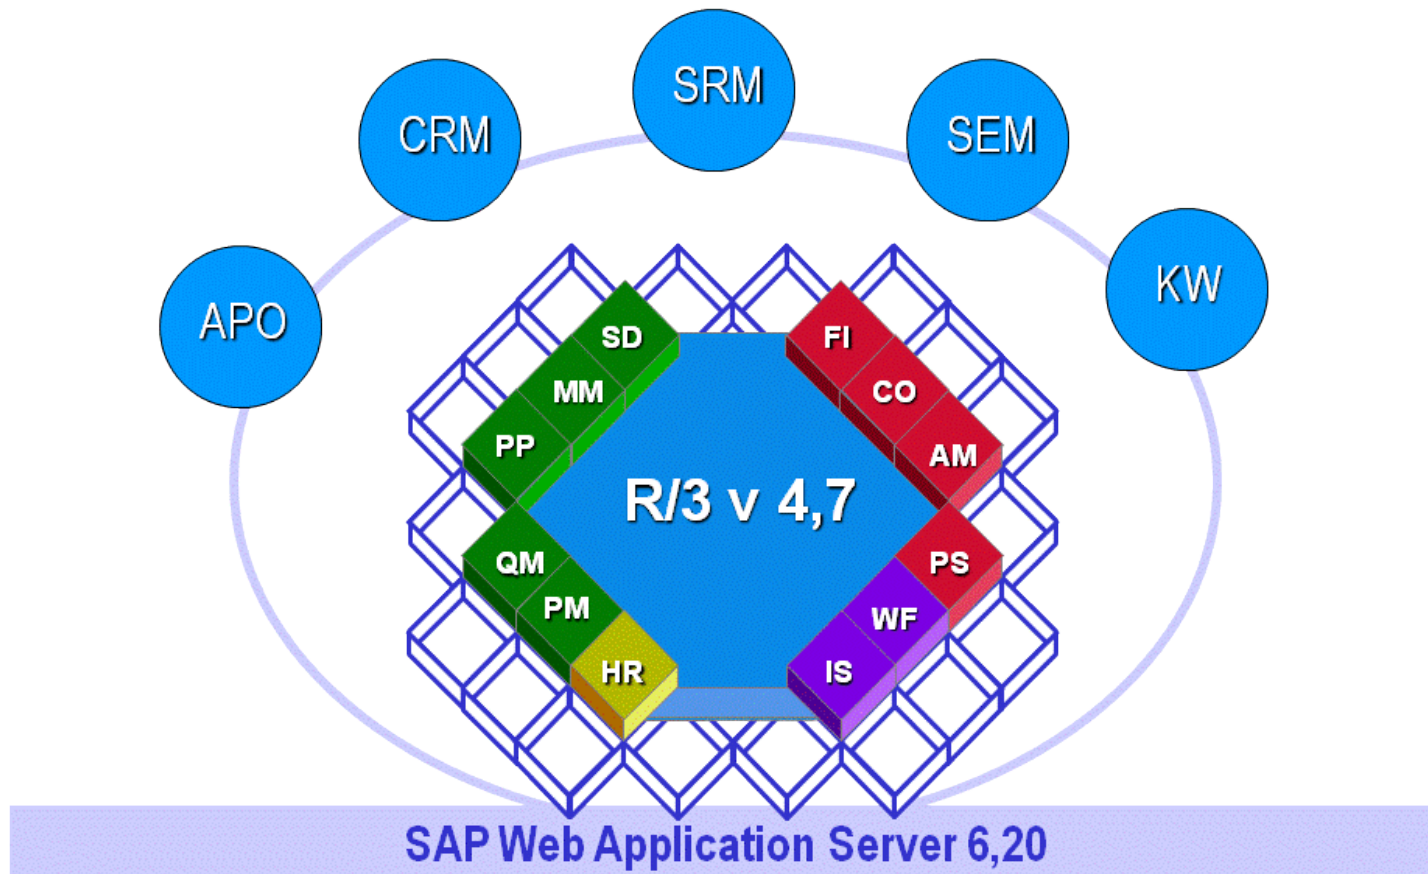

# ***Karta projektu***

*- struktura dokumentu*



## ***Karta projektu – struktura dokumentu:***

1. Definicja Projektu
2. Podejście do realizacji Projektu
3. Uzasadnienie Biznesowe Projektu
4. Struktura Zespołu Projektowego, role członków zespołów projektowych
5. Strategia Zarządzania Jakością
6. Strategia Zarządzania Konfiguracją
7. Strategia Zarządzania Ryzykiem
8. Plan Komunikacji
9. Plan Projektu
10. Mechanizmy sterowania Projektem
11. Dostosowanie metodyki do Projektu

Załączniki

# ***Karta projektu***

*pytania?*

# ***Karta projektu***

## *Zadanie:*

- 1. Opracowanie szablonu dokumentu, tj. strona tytułowa, spis treści oraz zawartość merytoryczna (punkty tematyczne obejmujące strukturę dokumentu).*
- 2. Definicja Projektu*
